Azonos	Tevékenység neve	Méret	Hossz (fm)	HBCS száma (db)	Időtartam	Kezdés	Befejezés	Megelőzők
1	**BKISZ projekt Csatornázás VII. tender - STRABAG-PENTA KONZORCIUM**				**459 nap**	**H 19.08.12.**	**Cs 20.11.12.**	
2	Szerződés kötés				1 nap	H 19.08.12.	H 19.08.12.	
3	**Központi költségek**				**459 nap**	**H 19.08.12.**	**Cs 20.11.12.**	
4	Biztosítások költsége				459 nap	H 19.08.12.	Cs 20.11.12.	2KK
5	Garanciák költsége				459 nap	H 19.08.12.	Cs 20.11.12.	2KK
6	Kivitelezői iroda működtetése				459 nap	H 19.08.12.	Cs 20.11.12.	2KK
7	EU arculat kialakítása és fenntartása				459 nap	H 19.08.12.	Cs 20.11.12.	2KK
8	**A STRABAG Építőipari Zrt. által kivitelezett kerületek**				**261 nap**	**H 19.10.28.**	**P 20.11.06.**	
9	**III. Kerület**				**175 nap**	**H 20.03.02.**	**P 20.11.06.**	
10	**Prés utca**				**24 nap**	**Cs 20.08.27.**	**H 20.09.28.**	
11	CS 07 - csatornaépítés	NA 300 KG-PV	32,6	2	5 nap	Cs 20.08.27.	K 20.09.01.	17
12	B 07 - burkolathelyreállítás				4 nap	Sze 20.09.23.	H 20.09.28.	18
13	**Sajtoló utca**				**32 nap**	**K 20.08.04.**	**Cs 20.09.17.**	
14	CS 08 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PV	135,2	3	10 nap	K 20.08.04.	H 20.08.17.	20
15	B 08 - Burkolathelyreállítás				8 nap	K 20.09.08.	Cs 20.09.17.	21
16	**Ádámföldi (Szentendrei) utca**				**25 nap**	**K 20.08.18.**	**K 20.09.22.**	
17	CS 09 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PV	22,7	1	5 nap	K 20.08.18.	Sze 20.08.26.	14
18	B 09 - Burkolathelyreállítás				3 nap	P 20.09.18.	K 20.09.22.	15
19	**Ádámföldi (Szentendrei) utca**				**44 nap**	**K 20.07.07.**	**H 20.09.07.**	
20	CS 10 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PV	232,1	11	20 nap	K 20.07.07.	H 20.08.03.	2BK+225 nap
21	B 10 - Burkolathelyreállítás				9 nap	Cs 20.08.27.	H 20.09.07.	2BK+260 nap
22	**Korongozó utca**				**23 nap**	**Cs 20.07.16.**	**H 20.08.17.**	
23	CS 11 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PV	181,6	8	15 nap	Cs 20.07.16.	Sze 20.08.05.	2BK+232 nap
24	B 11 - Burkolathelyreállítás				8 nap	Cs 20.08.06.	H 20.08.17.	23
25	**Laborc köz (L-1-0-0)**				**64 nap**	**Sze 20.07.01.**	**K 20.09.29.**	
26	CS 12 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PV	648,9	25	40 nap	Sze 20.07.01.	Cs 20.08.27.	2BK+221 nap
27	B 12 - Burkolathelyreállítás				25 nap	Cs 20.08.27.	K 20.09.29.	2BK+260 nap
28	**Laborc köz (L-1-0-1 és L-1-2-0)**				**25 nap**	**P 20.08.28.**	**Sze 20.09.30.**	
29	CS 13 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PV	155,6	16	15 nap	P 20.08.28.	Sze 20.09.16.	26
30	B 13 - Burkolathelyreállítás				10 nap	Cs 20.09.17.	Sze 20.09.30.	29
31	**Toronya u. (T-2-0-0)**				**20 nap**	**Cs 20.08.06.**	**Cs 20.09.03.**	
32	CS 14 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PV	28,5	2	5 nap	Cs 20.08.06.	Sze 20.08.12.	23
33	B 14 - Burkolathelyreállítás				1 nap	Cs 20.09.03.	Cs 20.09.03.	36
34	**Toronya u. (T-1-0-0)**				**14 nap**	**Cs 20.08.13.**	**Sze 20.09.02.**	
35	CS 15 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PV	5,5	0	5 nap	Cs 20.08.13.	Sze 20.08.19.	32
36	B 15 - Burkolathelyreállítás				2 nap	K 20.09.01.	Sze 20.09.02.	39
37	**Toronya u. (NY-2-0-0)**				**7 nap**	**H 20.08.24.**	**H 20.08.31.**	
38	CS 16 - Csatornaépítés	D 63 KPE	57,2	0	5 nap	H 20.08.24.	P 20.08.28.	35
39	B 16 - Burkolathelyreállítás				2 nap	Szo 20.08.29.	H 20.08.31.	38
40	**Rézüst u.-Árok u.**				**29 nap**	**Szo 20.08.29.**	**Sze 20.10.07.**	
41	CS 21 - csatornaépítés	NA 300 KG-PV	120,2	6	10 nap	Szo 20.08.29.	Cs 20.09.10.	38
42	B 21 - burkolathelyreállítás				6 nap	Sze 20.09.30.	Sze 20.10.07.	2BK+285 nap
43	**Erdőalja köz**				**30 nap**	**H 20.08.24.**	**Cs 20.10.01.**	
44	CS 22 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PV	259,7	11	20 nap	H 20.08.24.	Cs 20.09.17.	2BK+257 nap
45	B 22 - Burkolathelyreállítás				10 nap	P 20.09.18.	Cs 20.10.01.	44
46	**Laborc utca, Toldás köz**				**20 nap**	**Sze 20.09.23.**	**K 20.10.20.**	
47	CS 23 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PV	205,8	12	15 nap	Sze 20.09.23.	K 20.10.13.	2BK+280 nap
48	B 23 - Burkolathelyreállítás				10 nap	Sze 20.10.07.	K 20.10.20.	2BK+290 nap
49	**Laborc utca NY 1-0-0**				**14 nap**	**Sze 20.10.14.**	**K 20.10.27.**	
50	CS 24 - Csatornaépítés	D 63 KPE	93	0	5 nap	Sze 20.10.14.	K 20.10.20.	47
51	B 24 - Burkolathelyreállítás				4 nap	Sze 20.10.21.	K 20.10.27.	48
52	**Laborc utca L-2-0-0**				**32 nap**	**Cs 20.09.17.**	**H 20.11.02.**	
53	CS 25 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PV	159,9	11	20 nap	Cs 20.09.17.	Sze 20.10.14.	29
54	B 25 - Burkolathelyreállítás				7 nap	Cs 20.10.22.	H 20.11.02.	56
55	**Laborc utca NY 2-0-0**				**14 nap**	**Cs 20.10.15.**	**Sze 20.11.04.**	
56	CS 26 - Csatornaépítés	D 63 KPE	26	0	5 nap	Cs 20.10.15.	Sze 20.10.21.	53
57	B 26 - Burkolathelyreállítás				2 nap	K 20.11.03.	Sze 20.11.04.	54
58	**Ürömhegyi Lejtő**				**80 nap**	**H 20.05.18.**	**K 20.09.08.**	
59	CS 01 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PV	635,5	16	31 nap	H 20.05.18.	K 20.06.30.	2BK+190 nap
60	B 01 - Burkolathelyreállítás				20 nap	K 20.08.11.	K 20.09.08.	2BK+250 nap
61	**Szakóca u. (Ürömhegyi lejtő)**				**59 nap**	**H 20.06.22.**	**P 20.09.11.**	
62	CS 02 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PV	74	5	5 nap	H 20.06.22.	P 20.06.26.	2BK+214 nap
63	B 02 - Burkolathelyreállítás				3 nap	Sze 20.09.09.	P 20.09.11.	60
64	**Ürömfű u.**				**60 nap**	**H 20.06.29.**	**H 20.09.21.**	
65	CS 03 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PV	399,8	32	45 nap	H 20.06.29.	H 20.08.31.	62
66	B 03 - Burkolathelyreállítás				15 nap	K 20.09.01.	H 20.09.21.	65
67	**Ürömfű u.**				**56 nap**	**K 20.07.07.**	**Sze 20.09.23.**	
68	CS 04 - Csatornaépítés	D 63 KPE	39,6	0	5 nap	K 20.07.07.	H 20.07.13.	2BK+225 nap

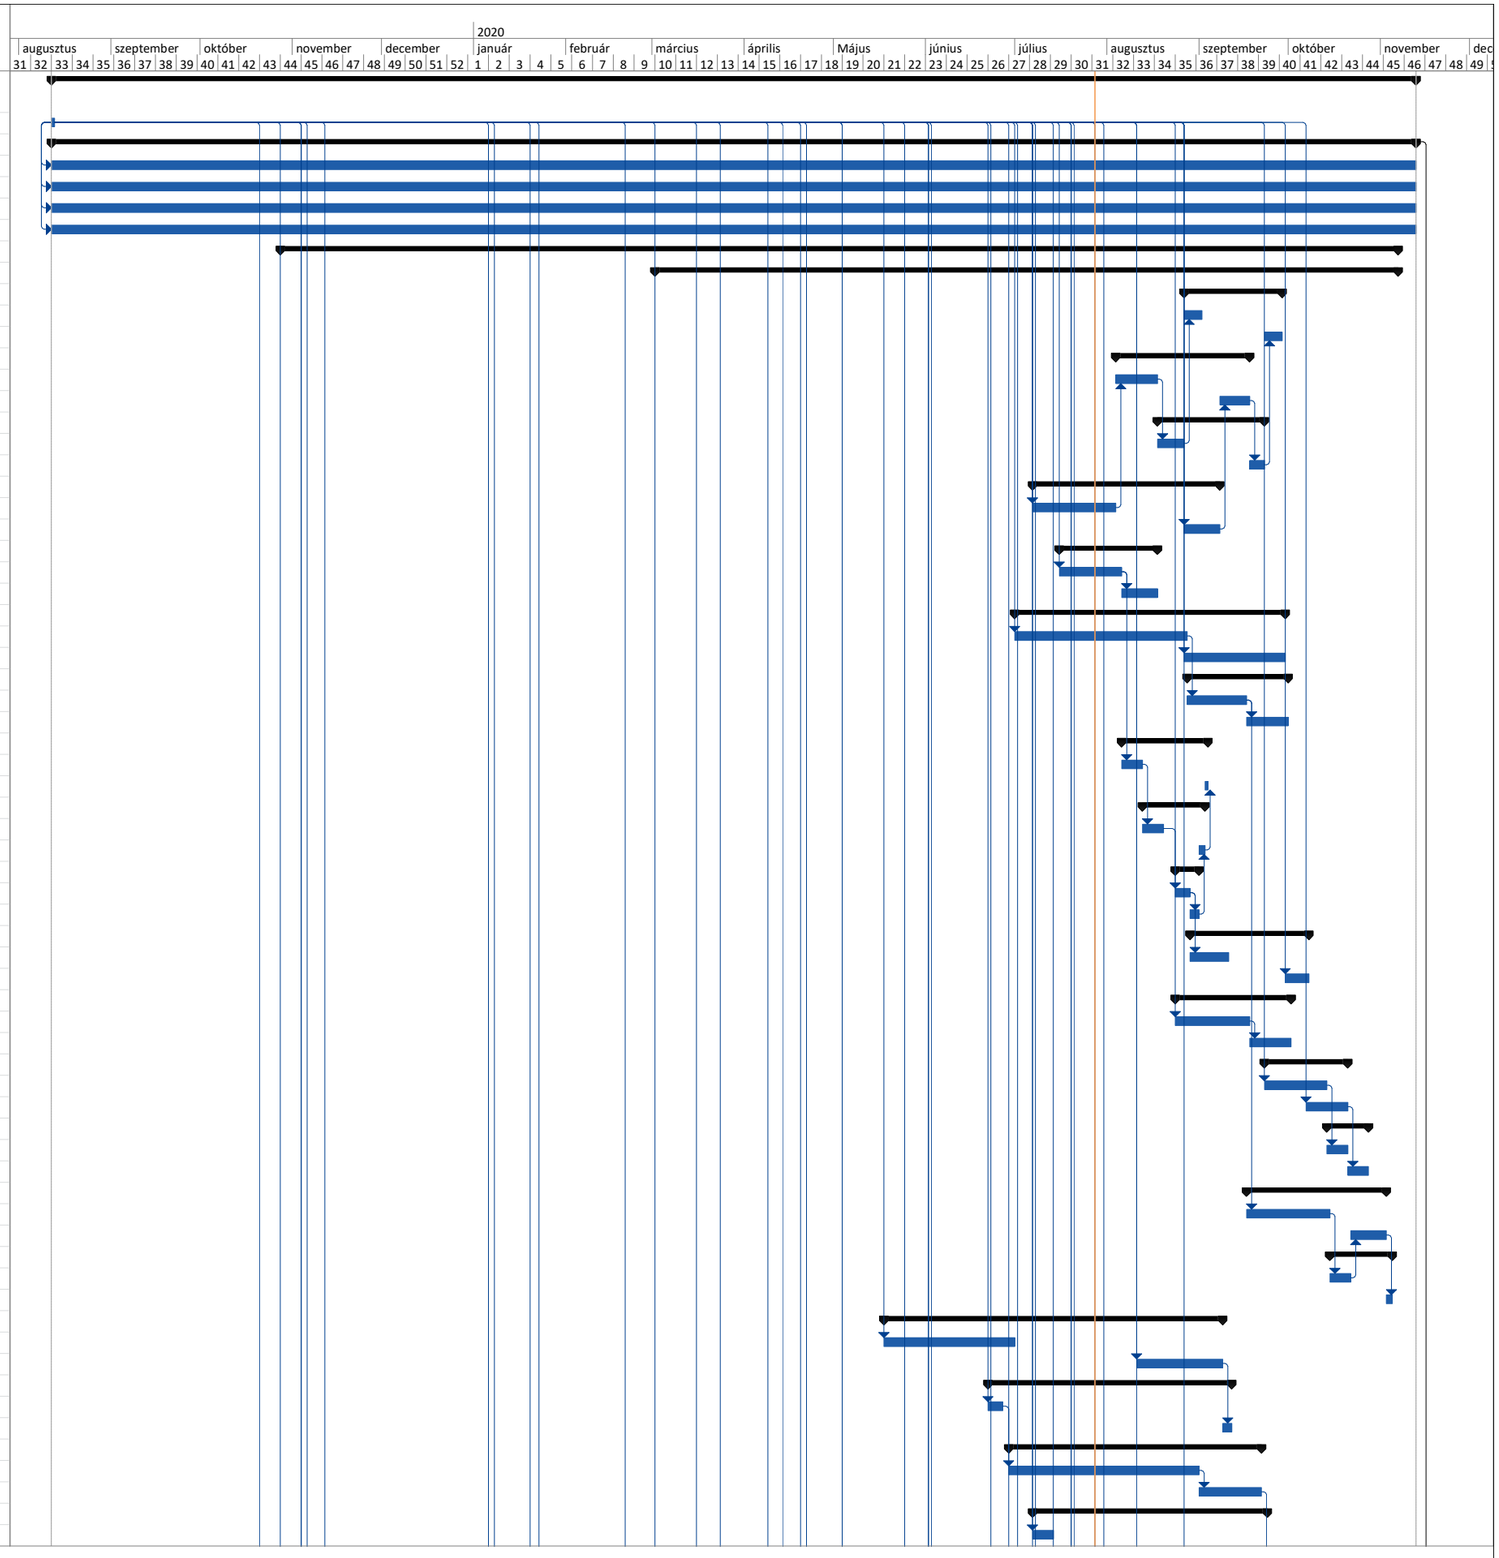

Projekt: BKISZ VII. projekt
Dátum: K 20.07.28.

Tevékenység | Összefoglalás | Külső mérföldkő | Inaktív összefoglalás | Kézi összefoglaló vetítés | Csak befejezés
Megszakított tevékenység | Projekt összefoglalása | Inaktív tevékenység | Kézi tevékenység | Kézi összegzés | Határidő
Mérföldkő | Külső tevékenységek | Inaktív mérföldkő | Csak időtartam | Csak kezdet | Végrehajtás

Azonos		Tevékenység neve	Méret	Hossz (fm)	HBCS száma (db)	Időtartam	Kezdés	Befejezés	Megelőzők
69		B 04 - Burkolathelyreállítás				2 nap	K 20.09.22.	Sze 20.09.23.	66
70		**I. ütem SZ-1-1 Mocsáros dűlő - Saroglya u.**				**123 nap**	**H 20.03.02.**	**Sze 20.08.26.**	
71		CS 18 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PV	1665	22	60 nap	H 20.03.02.	K 20.05.26.	2BK+137 nap
72		B 18 - Burkolathelyreállítás				20 nap	K 20.07.28.	Sze 20.08.26.	2BK+240 nap
73		**Szőlővész utca**				**27 nap**	**Cs 20.08.27.**	**Cs 20.10.01.**	
74		CS 27 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PV	99,8	6	15 nap	Cs 20.08.27.	K 20.09.15.	2BK+260 nap
75		B 27 - Burkolathelyreállítás				12 nap	Sze 20.09.16.	Cs 20.10.01.	74
76		**Jutas utca 1-0-0 ; 1-2-0**				**37 nap**	**Sze 20.09.16.**	**P 20.11.06.**	
77		CS 28 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PV	266,2	15	30 nap	Sze 20.09.16.	Sze 20.10.28.	74
78		B 28 - Burkolathelyreállítás				7 nap	Cs 20.10.29.	P 20.11.06.	77
79		**XI. Kerület**				**169 nap**	**H 19.11.04.**	**P 20.07.03.**	
80		**Kondorfa 15**				**71 nap**	**K 20.03.24.**	**P 20.07.03.**	
81		CS 01 - csatornaépítés	NA 300 KG-PV	39,4	1	5 nap	K 20.03.24.	H 20.03.30.	2BK+153 nap
82		B 01 - burkolathelyreállítás				2 nap	Cs 20.07.02.	P 20.07.03.	2BK+222 nap
83		**Napóra**				**156 nap**	**H 19.11.04.**	**K 20.06.16.**	
84		CS 02 - csatornaépítés	NA 300 KG-PV	228,9	11	39 nap	H 19.11.04.	H 20.01.20.	2BK+55 nap
85		B 02 - burkolathelyreállítás				11 nap	K 20.06.02.	K 20.06.16.	2BK+200 nap
86		**Örkény István u.**				**113 nap**	**K 20.01.21.**	**K 20.06.30.**	
87		CS 03 - csatornaépítés	NA 300 KG-PV	118,5	6	19 nap	K 20.01.21.	P 20.02.14.	84
88		B 03 - burkolathelyreállítás				10 nap	Sze 20.06.17.	K 20.06.30.	85
89		**XVII. Kerület**				**190 nap**	**H 19.10.28.**	**K 20.07.28.**	
90		**Agyaghegyi köz (II.ütem/3.rész)**				**129 nap**	**H 20.01.27.**	**K 20.07.28.**	
91		CS 01 - csatornaépítés	NA 300 KG-PV	29,4	1	6 nap	H 20.01.27.	H 20.02.03.	100
92		B 01 - burkolathelyreállítás				1 nap	K 20.07.28.	K 20.07.28.	98
93		**Ferihegyi út**				**43 nap**	**H 20.05.25.**	**Cs 20.07.23.**	
94		CS 02 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PV	71,5	4	15 nap	H 20.05.25.	H 20.06.15.	2BK+195 nap
95		B 02 - Burkolathelyreállítás				3 nap	K 20.07.21.	Cs 20.07.23.	2BK+235 nap
96		**Ferihegyi út nyomott**				**30 nap**	**K 20.06.16.**	**H 20.07.27.**	
97		CS 03 - Csatornaépítés	D 63 KPE	115,2	0	9 nap	K 20.06.16.	P 20.06.26.	94
98		B 03 - Burkolathelyreállítás				2 nap	P 20.07.24.	H 20.07.27.	95
99		**Mezővár utca**				**140 nap**	**H 20.01.06.**	**Sze 20.07.22.**	
100		CS 04 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PV	81,5	6	15 nap	H 20.01.06.	P 20.01.24.	2BK+97 nap
101		B 04 - Burkolathelyreállítás				2 nap	K 20.07.21.	Sze 20.07.22.	111
102		**Mezővár utca**				**178 nap**	**K 19.11.12.**	**P 20.07.24.**	
103		CS 05 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PV	234	18	27 nap	K 19.11.12.	H 19.12.16.	2BK+61 nap
104		B 05 - Burkolathelyreállítás				2 nap	Cs 20.07.23.	P 20.07.24.	101
105		**Mező köz**				**141 nap**	**Sze 20.01.08.**	**H 20.07.27.**	
106		CS 06 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PV	107	8	22 nap	H 20.02.03.	K 20.03.03.	107
107		V 06 - Vízkiváltás	NA 100 GÖV	110	0	18 nap	Sze 20.01.08.	P 20.01.31.	2BK+99 nap
108		B 02 - Burkolathelyreállítás				1 nap	H 20.07.27.	H 20.07.27.	104
109		**Mezőhegyes utca**				**180 nap**	**H 19.11.04.**	**H 20.07.20.**	
110		CS 07 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PV	97,5	2	11 nap	H 19.11.04.	H 19.11.18.	2BK+55 nap
111		B 07 - Burkolathelyreállítás				1 nap	H 20.07.20.	H 20.07.20.	117
112		**Mezőcsát utca**				**170 nap**	**Sze 19.11.06.**	**Sze 20.07.08.**	
113		CS 08 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PV	299,5	24	30 nap	Sze 19.11.06.	Szo 19.12.14.	2BK+57 nap
114		B 08 - Burkolathelyreállítás				2 nap	K 20.07.07.	Sze 20.07.08.	2BK+225 nap
115		**Mezőcsát grav-3 mezocs 2**				**183 nap**	**H 19.10.28.**	**P 20.07.17.**	
116		CS 09 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PV	279,5	23	35 nap	H 19.10.28.	Cs 20.01.16.	2BK+51 nap
117		B 09 - Burkolathelyreállítás				7 nap	Cs 20.07.09.	P 20.07.17.	114
118		**XVIII. Kerület**				**133 nap**	**H 20.03.16.**	**K 20.09.22.**	
119		**Határ utcai átemelő**				**80 nap**	**K 20.06.02.**	**K 20.09.22.**	
120		CS 01 - komplett műtárgy		1	0	80 nap	K 20.06.02.	K 20.09.22.	2BK+200 nap
121		B 01 - burkolathelyreállítás				5 nap	P 20.09.11.	Cs 20.09.17.	136
122		**Vezér u. NYSZV 1-0**				**73 nap**	**H 20.05.04.**	**Cs 20.08.13.**	
123		CS 02 - Csatornaépítés	D 63 KPE	50,1	0	11 nap	H 20.05.04.	Cs 20.07.30.	2BK+180 nap
124		B 02 - Burkolathelyreállítás				3 nap	K 20.08.11.	Cs 20.08.13.	2BK+250 nap
125		**Határ u. SZV 1-O**				**116 nap**	**H 20.03.16.**	**Szo 20.08.29.**	
126		CS 03 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PV	232,5	9	20 nap	H 20.03.16.	Cs 20.07.23.	2BK+147 nap
127		B 03 - Burkolathelyreállítás				10 nap	P 20.08.14.	Szo 20.08.29.	124
128		**Szálfa u. SZV 1-0**				**101 nap**	**Cs 20.04.09.**	**Sze 20.09.02.**	
129		CS 04 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PV	61,4	2	5 nap	Cs 20.04.09.	Cs 20.04.16.	2BK+165 nap
130		B 04 - Burkolathelyreállítás				3 nap	H 20.08.31.	Sze 20.09.02.	127
131		**Vezér u. SZV 2-o és Vezér u. csillapító bekötése**				**98 nap**	**H 20.04.20.**	**H 20.09.07.**	
132		CS 05 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PV	37,9	1	8 nap	H 20.04.20.	Cs 20.07.23.	2BK+170 nap
133		B 05 - Burkolathelyreállítás				3 nap	Cs 20.09.03.	H 20.09.07.	130
134		**Határ út SZV 2-1**				**99 nap**	**Sze 20.04.22.**	**Cs 20.09.10.**	
135		CS 06 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PV	95,5	3	17 nap	Sze 20.04.22.	Sze 20.07.29.	2BK+170 nap
136		B 06 - Burkolathelyreállítás				3 nap	K 20.09.08.	Cs 20.09.10.	133
137		**XXII. Kerület**				**177 nap**	**H 20.02.17.**	**K 20.10.27.**	

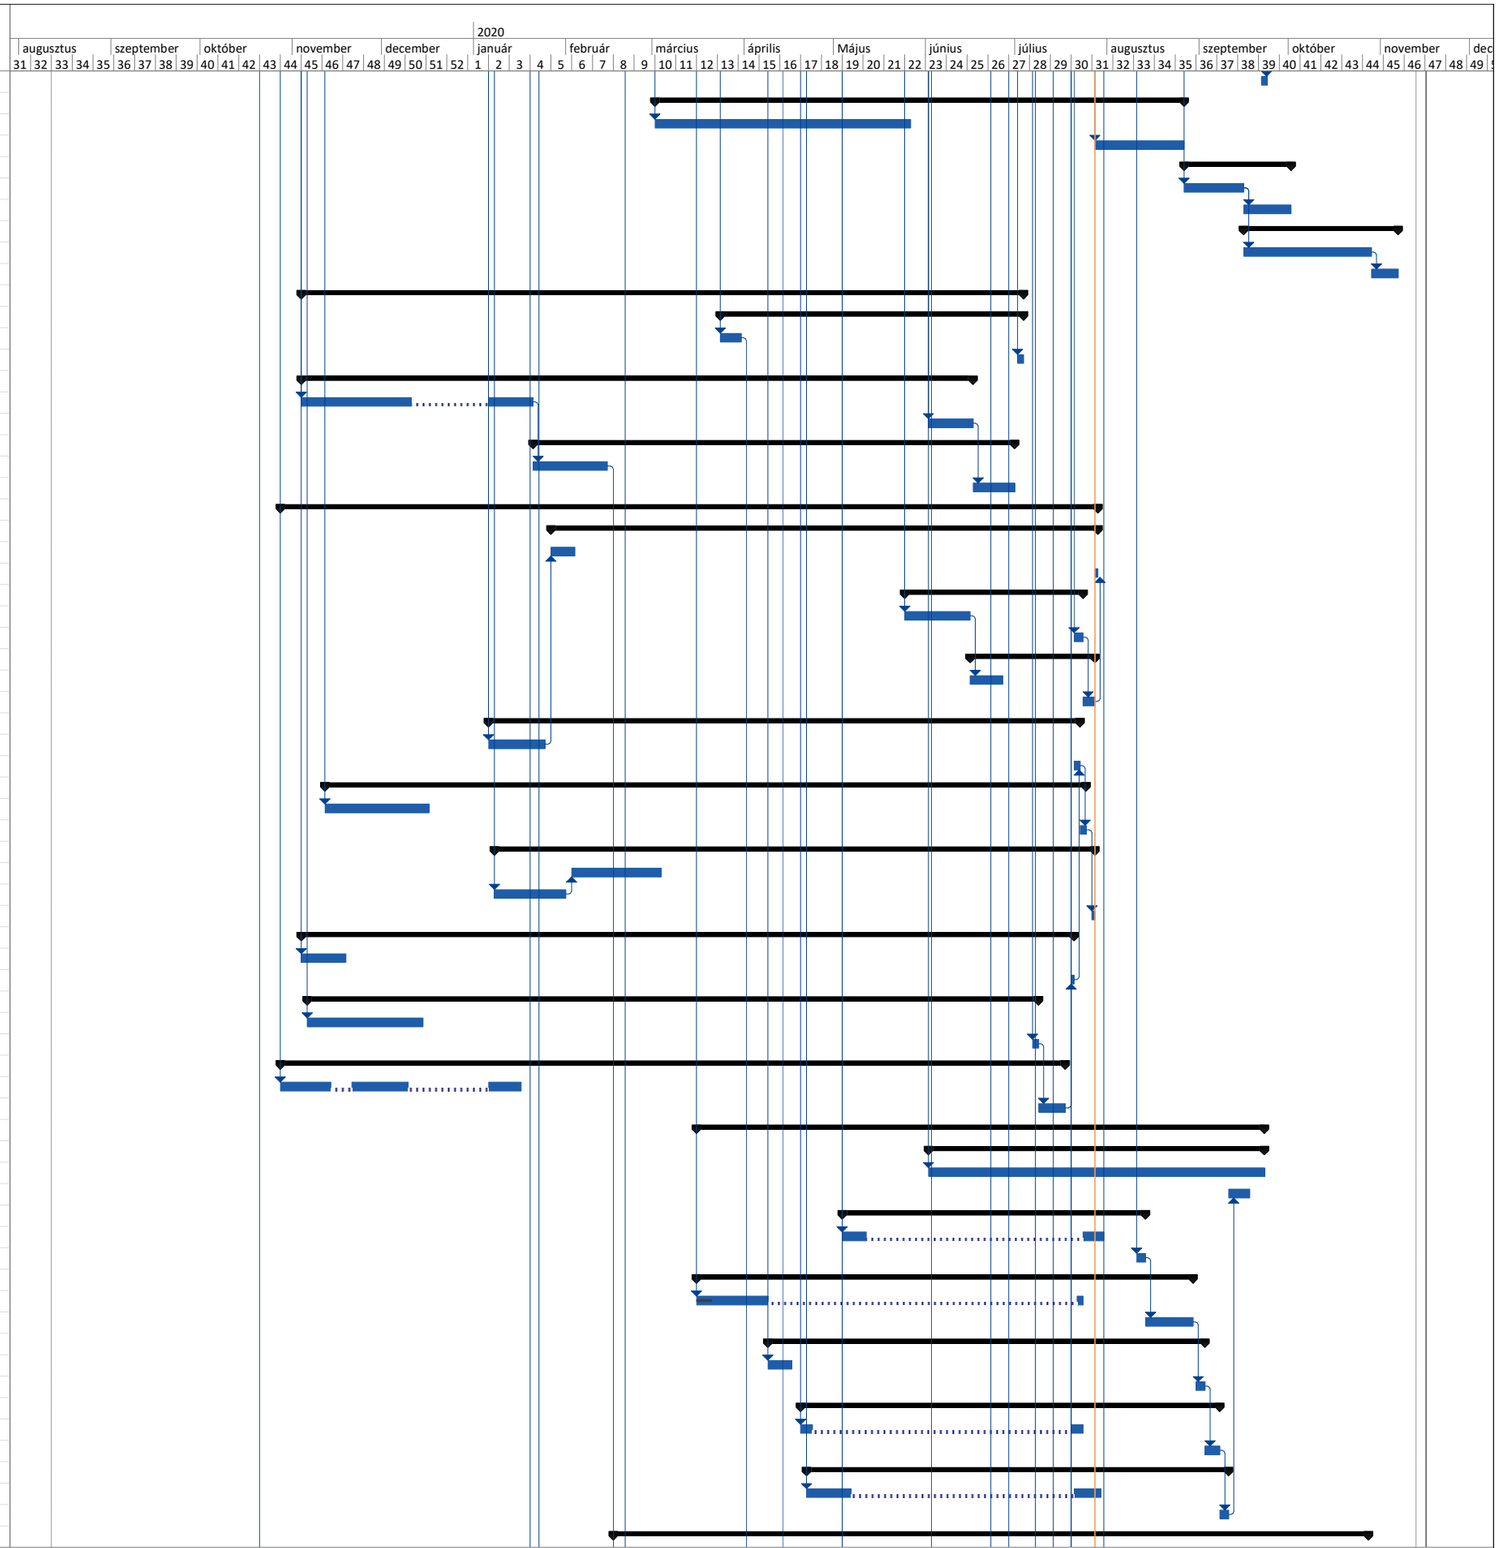

Projekt: BKISZ VII. projekt
Dátum: K 20.07.28.

Tevékenység | Összefoglalás | Külső mérföldkő | Inaktív összefoglalás | Kézi összefoglaló vetítés | Csak befejezés
Megszakított tevékenység | Projekt összefoglalása | Inaktív tevékenység | Kézi tevékenység | Kézi összegzés | Határidő
Mérföldkő | Külső tevékenységek | Inaktív mérföldkő | Csak időtartam | Csak kezdet | Végrehajtás

Azonos	Tevékenység neve	Méret	Hossz (fm)	HBCS száma (db)	Időtartam	Kezdés	Befejezés	Megelőzők
138	**Sárgarigó utca**				**82 nap**	**H 20.03.09.**	**P 20.07.03.**	
139	CS 01 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PV	165,9	0	7 nap	H 20.03.09.	K 20.03.17.	175
140	B 01 - Burkolathelyreállítás				2 nap	Cs 20.07.02.	P 20.07.03.	179
141	**Halom utca**				**10 nap**	**K 20.09.01.**	**H 20.09.14.**	
142	CS 02 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PV	78	2	5 nap	K 20.09.01.	H 20.09.07.	148
143	B 02 - Burkolathelyreállítás				5 nap	K 20.09.08.	H 20.09.14.	142
144	**Lánc utca (Kockakő)**				**35 nap**	**K 20.09.08.**	**K 20.10.27.**	
145	CS 03 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PV	120,2	9	15 nap	K 20.09.08.	H 20.09.28.	142
146	B 03 - Burkolathelyreállítás				20 nap	K 20.09.29.	K 20.10.27.	145
147	**Viharvédő-Diótörő utca**				**54 nap**	**K 20.07.14.**	**H 20.09.28.**	
148	CS 04 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PV	377,5	20	34 nap	K 20.07.14.	H 20.08.31.	2BK+230 nap
149	B 04 - Burkolathelyreállítás				20 nap	K 20.09.01.	H 20.09.28.	148
150	**Felső Sas utca**				**73 nap**	**K 20.03.31.**	**K 20.07.14.**	
151	CS 05 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PV	26,5	2	7 nap	K 20.03.31.	Sze 20.04.08.	81
152	B 05 - Burkolathelyreállítás				2 nap	H 20.07.13.	K 20.07.14.	155
153	**Gyepű utca-Fű utca**				**62 nap**	**K 20.04.14.**	**P 20.07.10.**	
154	CS 06 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PV	140	7	13 nap	K 20.04.14.	Cs 20.04.30.	2BK+167 nap
155	B 06 - Burkolathelyreállítás				5 nap	H 20.07.06.	P 20.07.10.	140
156	**Babérfűz**				**14 nap**	**Sze 20.07.01.**	**H 20.07.20.**	
157	CS 07 - Műtárgyépítés	D 63 KPE	14,5	0	5 nap	Sze 20.07.01.	K 20.07.07.	169
158	B 07 - Burkolathelyreállítás				1 nap	H 20.07.20.	H 20.07.20.	2BK+234 nap
159	**Tóth József utca**				**16 nap**	**K 20.09.29.**	**K 20.10.20.**	
160	CS 08 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PV	75,4	5	10 nap	K 20.09.29.	H 20.10.12.	145
161	B 08 - Burkolathelyreállítás				6 nap	K 20.10.13.	K 20.10.20.	160
162	**Mező utca**				**28 nap**	**H 20.05.18.**	**Cs 20.06.25.**	
163	CS 09 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PV	32,6	3	8 nap	H 20.05.18.	Sze 20.05.27.	178
164	B 09 - Burkolathelyreállítás				3 nap	K 20.06.23.	Cs 20.06.25.	2BK+215 nap
165	**Ady E. utca**				**23 nap**	**Cs 20.05.28.**	**K 20.06.30.**	
166	CS 10 - Csatornaépítés	D 63 KPE	15	0	12 nap	Cs 20.05.28.	H 20.06.15.	163
167	B 10 - Burkolathelyreállítás				2 nap	H 20.06.29.	K 20.06.30.	2BK+219 nap
168	**Szent Gellért u.**				**16 nap**	**Cs 20.06.25.**	**Cs 20.07.16.**	
169	CS 11 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PV	25,4	1	4 nap	Cs 20.06.25.	K 20.06.30.	172
170	B 11 - Burkolathelyreállítás				2 nap	Sze 20.07.15.	Cs 20.07.16.	152
171	**Mogyoró u**				**25 nap**	**K 20.06.16.**	**H 20.07.20.**	
172	CS 12 - Műtárgyépítés	D 63 KPE,NA 3	45	1	7 nap	K 20.06.16.	Sze 20.06.24.	166
173	B 12 - Burkolathelyreállítás				1 nap	H 20.07.20.	H 20.07.20.	2BK+234 nap
174	**Pógyor István**				**104 nap**	**H 20.02.17.**	**K 20.07.14.**	
175	CS 01 - Műtárgyépítés	NA 300 KG-PV	101,5	5	15 nap	H 20.02.17.	P 20.03.06.	87
176	B 01 - Burkolathelyreállítás				5 nap	Sze 20.07.08.	K 20.07.14.	2BK+226 nap
177	**Verseci u. 16-0-0**				**42 nap**	**H 20.05.04.**	**Sze 20.07.01.**	
178	CS 13 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PV	68,1	7	10 nap	H 20.05.04.	P 20.05.15.	154
179	B 13 - Burkolathelyreállítás				4 nap	P 20.06.26.	Sze 20.07.01.	164
180	**A PENTA Kft. által kivitelezett kerületek**				**383 nap**	**H 19.10.21.**	**P 20.11.06.**	
181	**III. Kerület**				**174 nap**	**H 20.01.20.**	**Sze 20.09.23.**	
182	**Almáskert utca**				**137 nap**	**H 20.01.20.**	**P 20.07.31.**	
183	CS 01 - csatornaépítés	NA 300 KG-PV	437,5	39	70 nap	H 20.01.20.	H 20.04.27.	2BK+107 nap
184	B 01 - burkolathelyreállítás				7 nap	Cs 20.07.23.	P 20.07.31.	183BK+60 nap
185	**Pirkadat utca**				**70 nap**	**K 20.04.28.**	**Sze 20.08.05.**	
186	CS 02 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PV	441,7	40	60 nap	K 20.04.28.	Sze 20.07.22.	183KK+70 nap
187	B 02 - Burkolathelyreállítás				10 nap	Cs 20.07.23.	Sze 20.08.05.	186
188	**Jutas utca**				**53 nap**	**Cs 20.06.18.**	**K 20.09.01.**	
189	CS 03 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PV	619,5	59	41 nap	Cs 20.06.18.	Cs 20.08.13.	186KK+35 nap
190	B 03 - Burkolathelyreállítás				12 nap	P 20.08.14.	K 20.09.01.	189
191	**Kőpor köz**				**11 nap**	**Cs 20.07.23.**	**Cs 20.08.06.**	
192	CS 04 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PV	130,1	10	8 nap	Cs 20.07.23.	H 20.08.03.	199
193	B 04 - Burkolathelyreállítás				3 nap	K 20.08.04.	Cs 20.08.06.	192
194	**Kőpor utca B/3-0-0**				**66 nap**	**K 20.06.23.**	**Sze 20.09.23.**	
195	CS 05 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PV	382,2	33	60 nap	K 20.06.23.	K 20.09.15.	198KK
196	B 05 - Burkolathelyreállítás				6 nap	Sze 20.09.16.	Sze 20.09.23.	195
197	**Kőpor utca H/12-3-0**				**22 nap**	**K 20.06.23.**	**Sze 20.07.22.**	
198	CS 06 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PV	82,3	6	10 nap	K 20.06.23.	H 20.07.06.	189KK+3 nap
199	B 06 - Burkolathelyreállítás				2 nap	K 20.07.21.	Sze 20.07.22.	198BK+10 nap
200	**IV. Kerület**				**28 nap**	**Sze 20.06.03.**	**P 20.07.10.**	
201	**Vasvári Pál utca**				**28 nap**	**Sze 20.06.03.**	**P 20.07.10.**	
202	CS 01 - csatornaépítés	NA 300 KG-PV	20,5	2	4 nap	Sze 20.06.03.	H 20.06.08.	2BK+201 nap
203	B 01 - burkolathelyreállítás				1 nap	P 20.07.10.	P 20.07.10.	202BK+23 nap
204	**XII. Kerület**				**69 nap**	**P 20.07.31.**	**P 20.11.06.**	
205	**Galgóczi köz**				**11 nap**	**K 20.10.13.**	**Sze 20.10.28.**	
206	**CS 01 - csatornaépítés**				**8 nap**	**K 20.10.13.**	**Cs 20.10.22.**	

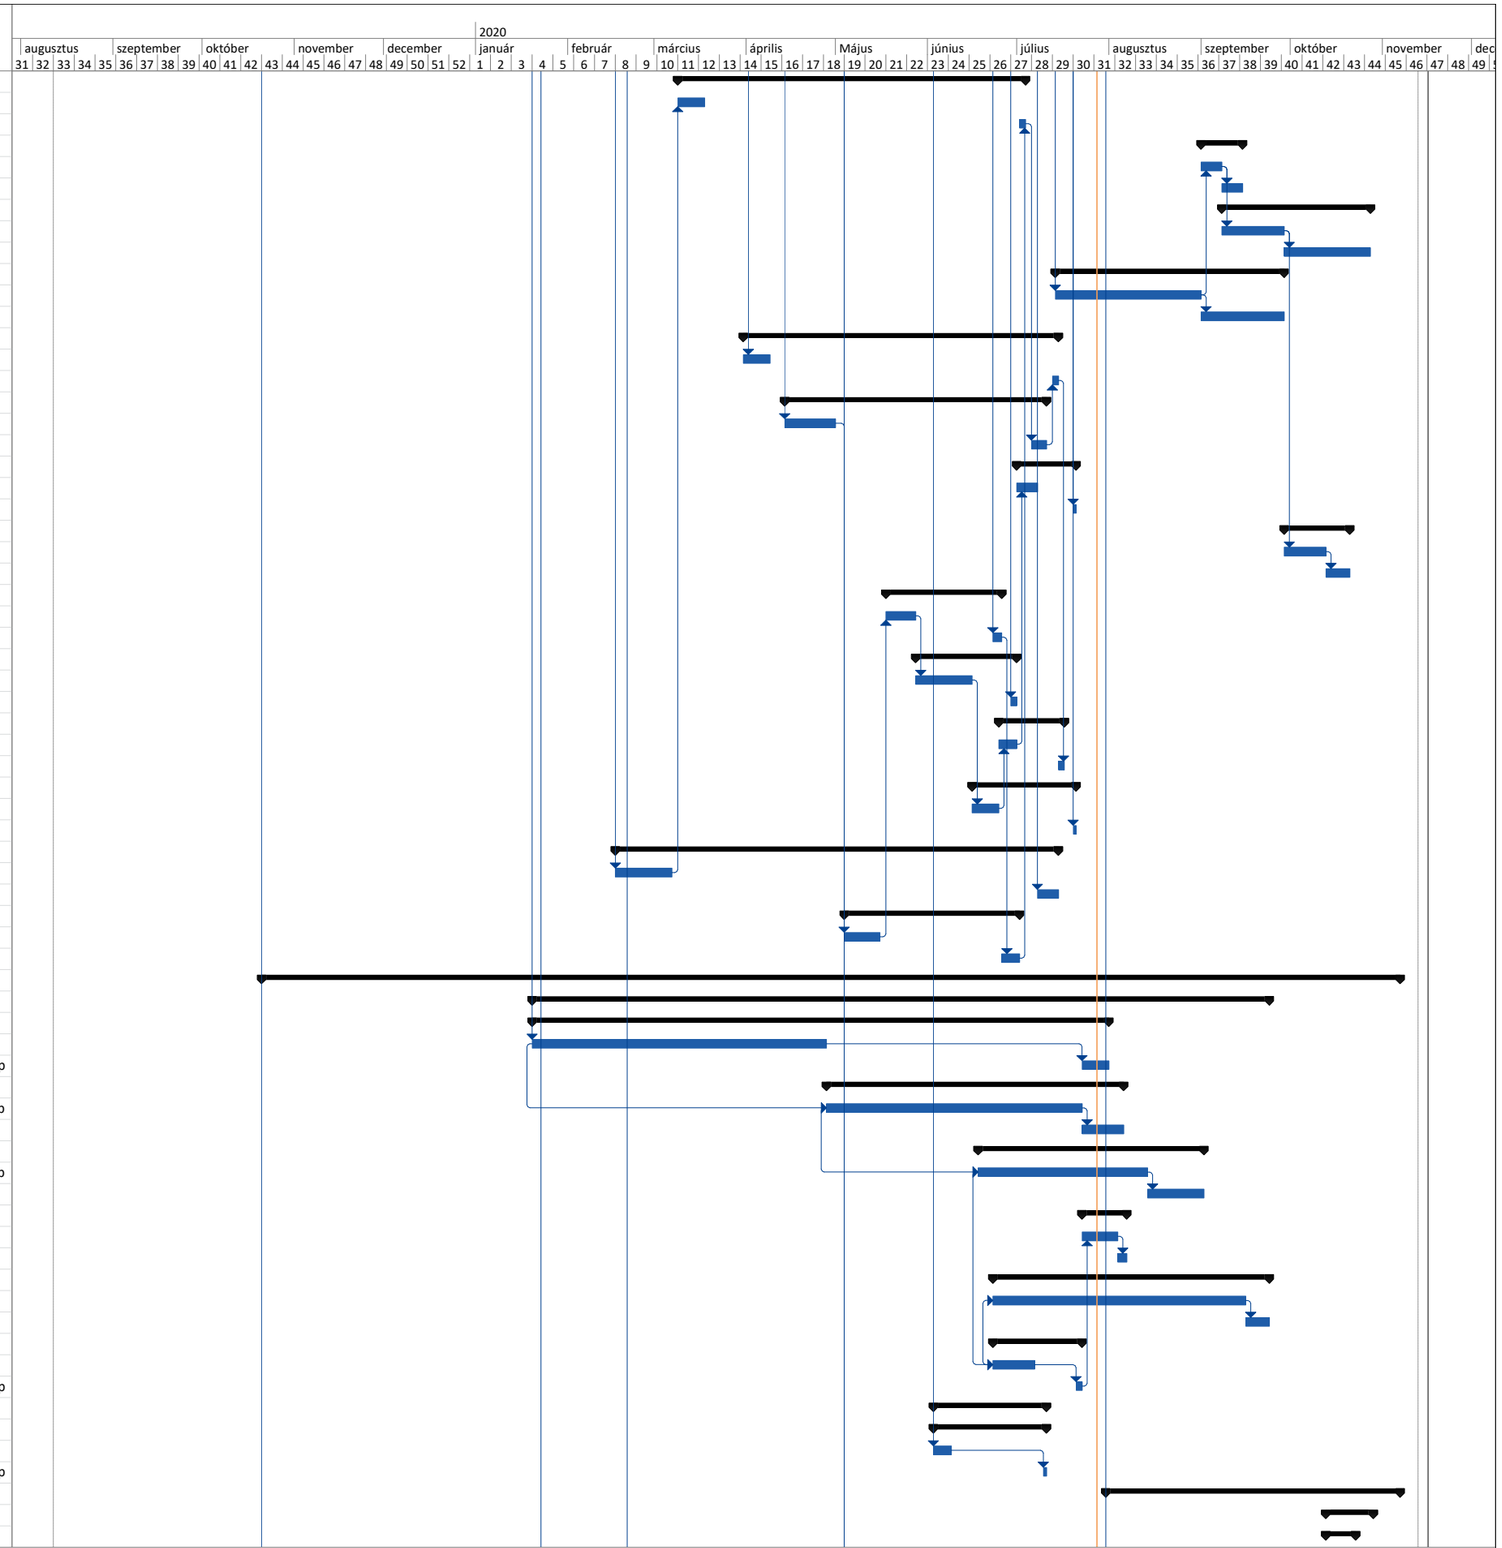

Projekt: BKISZ VII. projekt
Dátum: K 20.07.28.

Tevékenység | Összefoglalás | Külső mérföldkő | Inaktív összefoglalás | Kézi összefoglaló vetítés | Csak befejezés
Megszakított tevékenység | Projekt összefoglalása | Inaktív tevékenység | Kézi tevékenység | Kézi összegzés | Határidő
Mérföldkő | Külső tevékenységek | Inaktív mérföldkő | Csak időtartam | Csak kezdet | Végrehajtás

Azonos		Tevékenység neve	Méret	Hossz (fm)	HBCS száma (db)	Időtartam	Kezdés	Befejezés	Megelőzők
207		Sz 1-0-0	NA 300 KG-PV	3	0	1 nap	K 20.10.13.	K 20.10.13.	217
208		SZNY1	NA 75 KPE	97	2	7 nap	Sze 20.10.14.	Cs 20.10.22.	207
209		B 01 - burkolathelyreállítás				3 nap	H 20.10.26.	Sze 20.10.28.	208
210		**Rácz Aladár utca**				**18 nap**	**K 20.10.13.**	**P 20.11.06.**	
211		CS 02 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PV	203	8	14 nap	K 20.10.13.	H 20.11.02.	217
212		B 02 - Burkolathelyreállítás				4 nap	K 20.11.03.	P 20.11.06.	211
213		**Csiga utca**				**51 nap**	**P 20.07.31.**	**H 20.10.12.**	
214		CS 03 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PV	228	5	30 nap	Sze 20.08.05.	Sze 20.09.16.	215KK+3 nap
215		V 03 - Vízkiváltás	NA 100 gőv	238		30 nap	P 20.07.31.	P 20.09.11.	2BK+243 nap
216		Á 03 - Árokrendezés		127,5		13 nap	Cs 20.09.17.	H 20.10.05.	214
217		B 03 - Burkolathelyreállítás				5 nap	K 20.10.06.	H 20.10.12.	216
218		**XXIII. Kerület**				**264 nap**	**H 19.10.21.**	**Cs 20.11.05.**	
219		**Orbán utcai átemelő telep**				**92 nap**	**H 20.05.04.**	**Cs 20.09.10.**	
220		**CS 01 - Komplett műtárgy**				**92 nap**	**H 20.05.04.**	**Cs 20.09.10.**	
221		Szerkezetépítés				30 nap	H 20.05.04.	H 20.06.15.	2BK+180 nap
222		Gépészeti munkák				20 nap	K 20.06.16.	H 20.07.13.	221
223		Elektromos és irányítástechnikai munkák				20 nap	K 20.07.28.	Sze 20.08.26.	222BK+10 nap
224		Kerítés építés				6 nap	Cs 20.08.27.	Sze 20.09.02.	223
225		Térburkolat				6 nap	Cs 20.09.03.	Cs 20.09.10.	224
226		**Orbán utca SZV 1-0-0**				**251 nap**	**H 19.11.11.**	**Cs 20.11.05.**	
227		CS 02 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PV	602	34	60 nap	H 19.11.11.	Sze 20.02.05.	231KK+13 nap
228		V 02 - Vízkiváltás	NA 100 KPE	61,3		5 nap	P 20.10.30.	Cs 20.11.05.	227KK+246 nap
229		B 02 - Burkolathelyreállítás				10 nap	K 20.03.10.	H 20.03.23.	227;232
230		**Karmazsin utca SZV 1-0**				**96 nap**	**H 19.10.21.**	**H 20.03.09.**	
231		CS 03 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PV	493	40	45 nap	H 19.10.21.	P 19.12.20.	2BK+47 nap
232		B 03 - Burkolathelyreállítás				10 nap	K 20.02.25.	H 20.03.09.	231BK+41 nap
233		**Szőlődomb utca NYSZV 1-0**				**133 nap**	**Cs 20.01.23.**	**Cs 20.07.30.**	
234		CS 04 - Csatornaépítés	NA 90 KPE	96		6 nap	Cs 20.01.23.	Sze 20.07.29.	227BK-10 nap
235		B 04 - Burkolathelyreállítás				1 nap	Cs 20.07.30.	Cs 20.07.30.	237;234
236		**Orbánhegyi dűlő**				**134 nap**	**Cs 20.01.23.**	**P 20.07.31.**	
237		CS 05 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PV	4		4 nap	Cs 20.01.23.	K 20.07.28.	234KK
238		B 05 - Burkolathelyreállítás				1 nap	P 20.07.31.	P 20.07.31.	235
239		**Nyír utca - Alsóhatár út**				**197 nap**	**Cs 20.01.23.**	**P 20.10.30.**	
240		CS 06 - Csatornaépítés	NA 1000 beto	840,2	56	176 nap	Cs 20.01.23.	Sze 20.09.30.	2BK+110 nap
241		B 06 - Burkolathelyreállítás				21 nap	Cs 20.10.01.	P 20.10.30.	240
242		**Csatlakozó műtárgy**				**35 nap**	**K 20.08.11.**	**K 20.09.29.**	
243		CS 07 - Műtárgyépítés				30 nap	K 20.08.11.	K 20.09.22.	240KK+140 nap
244		B 07 - Burkolathelyreállítás				5 nap	Sze 20.09.23.	K 20.09.29.	243
245		**XXIII. Kerület Opciós tételek**				**160 nap**	**P 20.02.21.**	**Sze 20.10.07.**	
246		**Fatima utca**				**151 nap**	**P 20.02.21.**	**Cs 20.09.24.**	
247		**CS 01 - Csatornaépítés**				**143 nap**	**P 20.02.21.**	**H 20.09.14.**	
248		SZV 1-1-0	NA 300 KG-PV	301,8	0	20 nap	P 20.02.21.	Cs 20.03.19.	2BK+131 nap
249		SZV 1-2-0	NA 300 KG-PV	235	7	16 nap	K 20.08.25.	H 20.09.14.	255
250		B 01 - Burkolathelyreállítás				8 nap	K 20.09.15.	Cs 20.09.24.	249
251		**Külső Vörösmarty utca**				**132 nap**	**P 20.03.20.**	**P 20.09.25.**	
252		CS 02 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PV	40	4	3 nap	P 20.03.20.	K 20.03.24.	248
253		B 02 - Burkolathelyreállítás				1 nap	P 20.09.25.	P 20.09.25.	250
254		**Szőlősor utca**				**44 nap**	**H 20.08.03.**	**P 20.10.02.**	
255		CS 03 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PV	190	24	14 nap	H 20.08.03.	H 20.08.24.	258BK+80 nap
256		B 03 - Burkolathelyreállítás				5 nap	H 20.09.28.	P 20.10.02.	253
257		**Temető sor**				**137 nap**	**Sze 20.03.25.**	**Sze 20.10.07.**	
258		CS 04 - Csatornaépítés	NA 300 KG-PV	150	9	10 nap	Sze 20.03.25.	K 20.04.07.	252
259		B 04 - Burkolathelyreállítás				3 nap	H 20.10.05.	Sze 20.10.07.	256
260		Műszaki átadás-átvétel				0 nap	Cs 20.11.12.	Cs 20.11.12.	3BB
261									
262		Megjegyzés a központi költségek sorai és az összegző sorok naptári napokkal számolnak, míg az utcánkénti tevékenységek munkanapokkal							
263									
264									

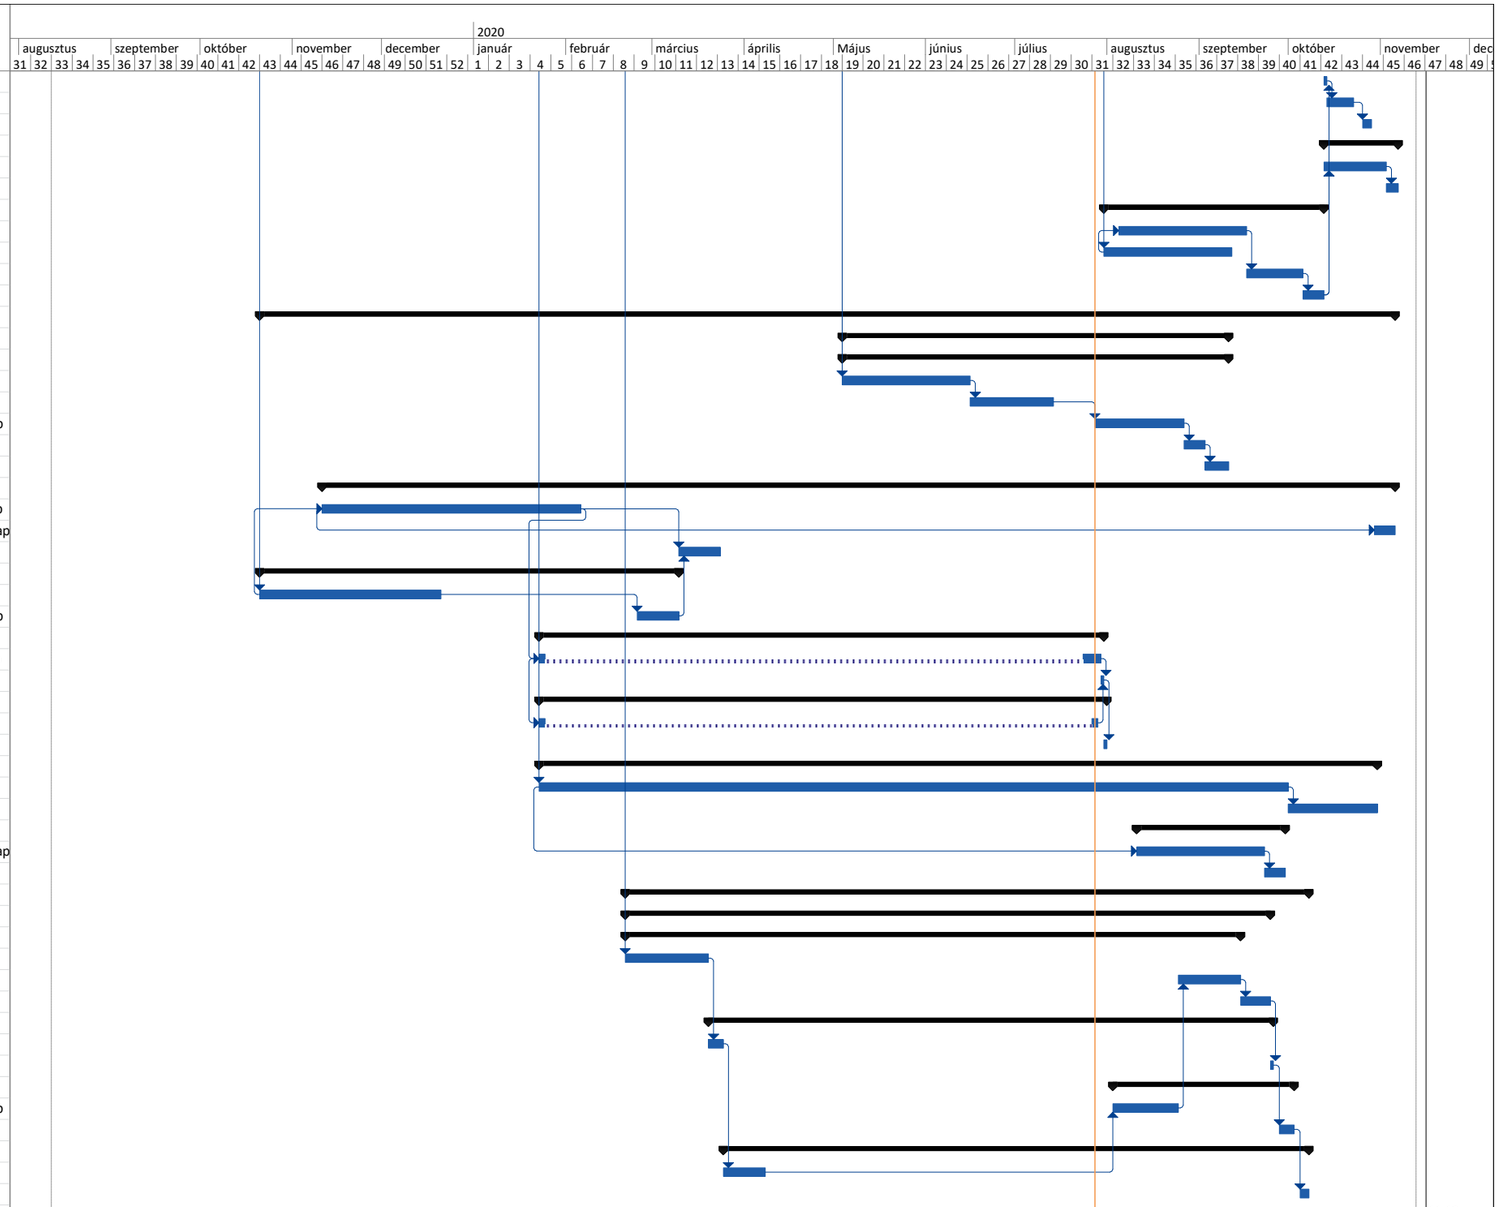

Projekt: BKISZ VII. projekt
Dátum: K 20.07.28.

Tevékenység	Összefoglalás	Külső mérföldkő	Inaktív összefoglalás	Kézi összefoglaló vetítés	Csak befejezés			
Megszakított tevékenység	Projekt összefoglalása	Inaktív tevékenység	Kézi tevékenység	Kézi összegzés	Határidő			
Mérföldkő	Külső tevékenységek	Inaktív mérföldkő	Csak időtartam	Csak kezdet	Végrehajtás			
